مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الأداره العامه للتنفيذ و الاشراف اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	☑ تقديم جديد
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم 6	☐ اعادة تقديم

اسم الحي :الامير فواز — رقم المخطط :BLOCK10 — رقم الشارع : PED-B10-24 — عرض الشارع: 9.40

☐ استلام الطبقة :BOTTOM SUBGRADE — من محطة رقم :0+00 — الى محطة رقم :0+46.05

☐ اعمال اخرى :

توقيع مدير المشروع : — التاريخ : / /

☐ المراقب — ☐ المساح — ☐ المختبر — توقيع المهندس المشرف :.....................

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه : .... — الي المحطه : ....

من المحطه : .... — الي المحطه : ....

مرفقات : ☐ القطاع الطولي — ☐ القطاع العرضي — ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... — التوقيع: — التاريخ : / /

من محطة : — الى محطة :

.... توقيع المساح : — التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد — ☐ مرفق — قيمه البركتور : — الرطوبه المثلي :

☐ غير مرفق

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطه	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح — ☐ راسب — التوقيع : .... — التاريخ : / /

ملاحظات

- يجب ارفاق نتائج اختبار الطين
في حالة لم يتم تنزيل الطبقة التالية بعد ١٥ يوم يتم اعادة تأهيل الطبقة

تعليمات المهندس الاستشاري :

☐ موافق — ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... — مندوب المقاول : .... — التوقيع : .... — التاريخ : / /

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.


الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	

تقـــرير إســـتلام طـبقـــة ردم

PED-B10-24		رقم الشارع :-		تلال الغروب				إسم المشروع :-				
46.05M		طول الشارع :-		BLOCK10				رقم المخطط :-				
9.4		عرض الشارع :-		BOUTTOM OF SUPGRADE-1				رقم الطبقة :-				
		WIDHT-R	4.700		LAYAER THICKNESS					0.150		
		WIDHT-L	4.700		DEOTH FROM TOP SUB.G					0.000		
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R	H
SLOPE				2.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%			
				-2.000	-2.700	0.000	2.700	2.000			
1	0	529109.934	2369678.196	52.920	52.960	52.960	52.960	52.920	4.700	4.700	-0.148
2	12.5	529114.735	2369689.737	52.944	52.984	52.984	52.984	52.944	4.700	4.700	0.008
3	25	529119.537	2369701.278	52.969	53.009	53.009	53.009	52.969	4.700	4.700	0.097
4	37.5	529124.338	2369712.819	52.993	53.033	53.033	53.033	52.993	4.700	4.700	0.109
5	46.05	529127.623	2369720.713	53.010	53.050	53.050	53.050	53.010	4.700	4.700	0.151

الإستشارى		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- حسام محمد		الإسم :- عبدالله حسن
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة
س.ت (1010284003)
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

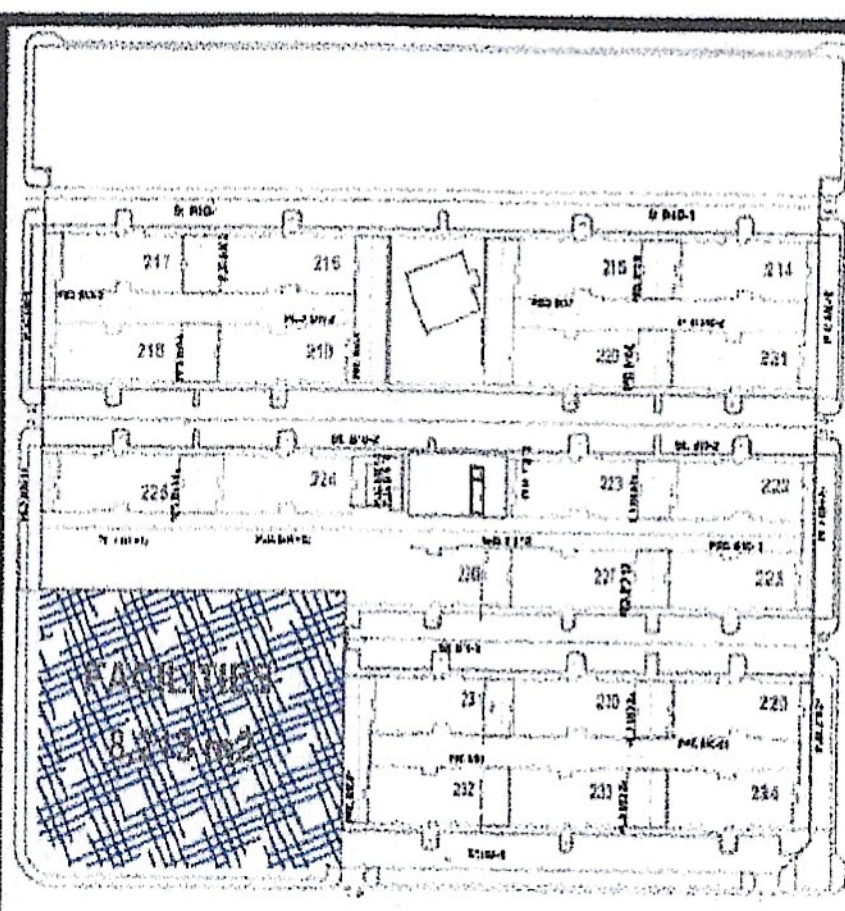

اتجاة تصريف المياة
الارض الطبيعية
الخط التصميمى
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

Abnia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة

مساح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:

مقياس الرسم:	1:1500	SPOT ELEVATIONSPLAN	22	NO.

مدير ادارة تصميم الطرق | مديرعام الدراسات والتصاميم

/٢
